

2026 环球网校一级建造师《建设工程经济》考点精讲
第 42 讲-第 19 章国际工程投标报价

- 【课前学习建议】
本讲为第 19 章的内容。
学习内容主要有：
①掌握国际工程投标总报价组成；
②了解国际工程投标报价程序，理解标前会议应注意的内容和工程量复核的目的；
③理解什么情况下报高价、什么情况报低价和不平衡报价法所考虑的方面。

第 19 章 国际工程投标报价

- 【考点概览】
➢国际工程投标报价构成（重要）
➢国际工程投标报价程序（了解）
➢国际工程投标报价技巧（重要）
【考点】国际工程投标报价构成（重要）
【考频：2024、2023、2021】

国际工程 投标总报 价组成	人工费		
	材料费		
	施工机具使用费		
	待摊费	现场管理费	工作人员费、办公费、差旅交通费、文体宣教费、固定资产使用费、国外生活设施使用费、工具用具使用费、劳动保护费、检验试验费、其他费用
		其他待摊费	临时设施工程费、保险费、税金、保函手续费、经营业务费、工程辅助费、贷款利息、总部管理费、利润、风险费
	开办费		
	分包工程费	分包报价	
		总包管理费和利润	
暂列金额（招标人备用金）			

- 【课中知识拓展】
现场管理费、临时工程设施费、保险费、税金等是在工程量清单中未单独列项的费用项目，需将
其作为待摊费用分摊到工程量清单的各个报价分项中去。

- 【考点清单】
1. 概念题：待摊费的内容，现场管理费和其他待摊的区分
2. 概念题：暂列金额的概念
【例题·单选】国际工程中业主在招标文件中规定的暂列金额正确处理方式（ ）。【2022】
A. 计入投标总价，由承包人决定使用
B. 不计入投标总价，实际发生时业主支付
C. 计入投标总价，但承包人无权自主使用
D. 不计入投标总价，由工程师决定使用

【答案】C

【解析】暂列金额是业主在招标文件中明确规定了数额的一笔招标人备用金，标明用于工程施工，或供应材料，或提供服务，或应付意外情况，亦称特定金额或备用金。承包商在投标报价时均应将此暂列金额数计入工程总报价，但承包商无权做主使用此金额，这些项目的费用将按照业主工程师的指示与决定，全部或部分使用。

- 【例题·单选】下列国际工程投标报价组成中，属于现场管理费的是（ ）。【2021】
A. 工程辅助费
B. 检验试验费
C. 临时设施工程费
D. 工程保险费

【答案】B


【解析】现场管理费包括：1. 工作人员费；2. 办公费；3. 差旅交通费；4. 文体宣教费；5. 固定资



产使用费；6. 国外生活设施使用费；7. 工具用具使用费；8. 劳动保护费；9. 检验试验费；10. 其他费用。工程辅助费、临时设施工程费和工程保险费属于其他待摊费。

【考点】国际工程投标报价程序（了解）

【考频：2022】

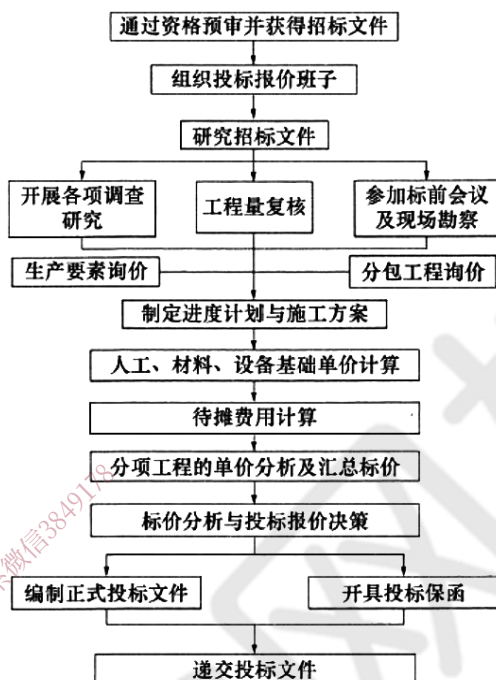

一、组织投标报价班子

二、研究招标文件

三、开展调查研究

四、参加标前会议及现场勘察

（一）参加标前会议应注意以下几点。

1. 对工程内容范围不清的问题应当提请说明，但**不要表示或提出任何修改设计方案的要求。**

2. 对招标文件中图纸与技术说明互相矛盾之处，可请求说明应以何者为准，但**不要轻易提出修改技术要求**。如果自己确实能提出对业主有利的修改方案，可在投标报价时提出，并做出相应的报价供业主选择而不必在会议中提出。

3. 对含糊不清、容易产生歧义理解的合同条件，可以请求给予澄清、解释，但**不要提出任何改变合同条件的要求。**

4. 投标人应注意提问的技巧，**不要批评或否定**业主在招标文件中的有关规定，提问的问题应是招标文件中比较明显的错误或疏漏，不要将己方机密的设计方案或施工方案透露给竞争对手，同时要仔细倾听业主和竞争对手的谈话，从中探索他们的态度、经验和管理水平。

（二）现场勘察

现场勘察一般是标前会议的一部分，招标人会组织所有投标人进行现场参观和说明。

五、工程量复核

工程量复核不仅是便于准确计算投标价格，更是今后在实施工程中测量每项工程量的依据，同时也是安排施工进度计划、选定施工方案的重要依据。

当发现遗漏或相差较大时，投标人不能随便改动工程量，仍应按招标文件的要求填报自己的报价，但可在投标函中适当予以额外说明。

【考点清单】

1. 概念题：标前会议应注意的内容

2. 概念题：工程量复核的目的

【例题·单选】国际工程投标中，投标人在投标截止日前发现招标工程量清单中某分项工程的工程量有计算错误，宜采用的做法是（ ）。【2022】

A. 按照投标人自行修订的工程量填报单价，另在投标函中予以说明

B. 电话咨询招标人，根据招标人口头认可的工程量填报单价



- C. 按照原招标文件的工程量填报单价，可另在投标函中予以说明
D. 按照施工中可能发生的工程量填报单价，另在投标函中予以说明

【答案】C

【解析】当发现遗漏或相差较大时，投标人不能随便改动工程量，仍应按招标文件的要求填报自己的报价，但可在投标函中适当予以额外说明。

【例题·单选】下列投标人在国际工程标前会议上的做法，正确的是（ ）。【2020】

- A. 对招标文件中图纸与技术说明矛盾之处，提出己方的修改意见
B. 提出对业主有利的设计方案修改意见
C. 详细阐述己方施工方案的优势和竞争力
D. 对工程内容范围不清的问题，请业主做出说明

【答案】D

【解析】参加标前会议应注意以下几点：

1. 对工程内容范围不清的问题应当提请说明，但不要表示或提出任何修改设计方案的要求；
2. 对招标文件中图纸与技术说明互相矛盾之处，可请求说明应以何者为准，但不要轻易提出修改技术要求；

3. 对含糊不清、容易产生歧义理解的合同条件，可以请求给予澄清、解释，但不要提出任何改变合同条件的要求；

4. 投标人应注意提问的技巧，不要批评或否定业主在招标文件中的有关规定，提问的问题应是招标文件中比较明显的错误或疏漏，不要将己方机密的设计方案或施工方案透露给竞争对手，同时要仔细倾听业主和竞争对手的谈话，从中探索他们的态度、经验和管理水平。

【考点】国际工程投标报价技巧（重要）

【考频：2024、2021】

一、根据招标项目的不同特点采用不同报价

国际工程投标报价时，既要考虑自身的优势和劣势，也要分析招标项目的特点。按照工程项目的不同特点、类别、施工条件等来选择报价策略。

1. 报价可高一些的工程

- (1) 施工条件差的工程；
(2) 专业要求高的技术密集型工程，而本公司在这方面有专长，声望也较高；
(3) 总价低的小型工程以及自己不愿做、又不方便不投标的工程；
(4) 特殊的工程，如港口码头、地下开挖工程等；
(5) 工期要求急的工程；
(6) 竞争对手少的工程；
(7) 支付条件不理想的工程。

2. 报价可低一些的工程

- (1) 施工条件好的工程；
(2) 工作简单、工程量大而一般公司都可以做的工程；
(3) 本公司目前急于打入某一市场、某一地区，或在该地区面临现有工程结束，而机械设备等无工地转移时；
(4) 本公司在附近有工程，而本项目又可利用该工地的设备、劳务，或有条件短期内突击完成的工程；

- (5) 竞争对手多，竞争激烈的工程；
(6) 非急需工程；
(7) 支付条件好的工程。

二、适当运用不平衡报价法

不平衡报价法也叫前重后轻法。一般可以在以下几个方面考虑采用不平衡报价法。

1. 能够**早日结账收款的项目**（如开办费、土石方工程、基础工程等）可以**报得高一些**，以利于资金周转，后期工程项目（如机电设备安装工程、装饰工程等）可适当降低。

2. 经过工程量核算，**预计今后工程量会增加的项目，单价可适当提高**，这样在最终结算时可获得超额利润，而将工程量可能减少的项目单价降低，工程结算时损失不大。

但是上述 1. 2. 两点要统筹考虑，针对工程量有错误的早期工程，如果不可能完成工程量表中的数



量，则不能盲目抬高报价，要具体分析后再确定。

3. **设计图纸不明确，估计修改后工程量要增加的，可以提高单价，**而对工程内容说明不清的，则可降低一些单价。

【考点清单】

1. 概念题：什么情况下报高价、什么情况报低价

2. 概念题：不平衡报价法所考虑的方面

【例题·单选】具有下列特点的国际工程项目中，投标报价适宜采用低价策略的是（ ）。【2021】

- A. 工作简单且支付条件好的工程
- B. 专业要求高且工期要求急的工程
- C. 竞争对手少且施工条件差的工程
- D. 技术复杂且投资规模大的工程

【答案】A

【解析】报价可低一些的工程

(1) 施工条件好的工程；

(2) 工作简单、工程量大而一般公司都可以做的工程；

(3) 本公司目前急于打入某一市场、某一地区，或在该地区面临现有工程结束，而机械设备等无工地转移时；

(4) 本公司在附近有工程，而本项目又可利用该工地的设备、劳务，或有条件短期内突击完成的工程；

(5) 竞争对手多，竞争激烈的工程；

(6) 非急需工程；

(7) 支付条件好的工程。

【例题·多选】在国际工程报价中，投标人为了既不提高总报价，又能在结算中获得更理想的经济效益，运用不平衡报价法时，可以适当偏高报价的有（ ）。【2019】

- A. 能早日结账收款的工程项目
- B. 预计不可能完全实施的早期工程项目
- C. 经核算预计今后工程量会增加较多的项目
- D. 预计工程量可能减少的后期工程项目
- E. 因设计图纸不明确可能导致工程量增加的项目

【答案】ACE


【解析】1. 能够早日结账收款的项目（如开办费、土石方工程、基础工程等）可以报得高一些，以利于资金周转，后期工程项目（如机电设备安装工程、装饰工程等）可适当降低。A 正确。

2. 经过工程量核算，预计今后工程量会增加的项目，单价可适当提高，这样在最终结算时可获得超额利润，而将工程量可能减少的项目单价降低，工程结算时损失不大。C 正确。

但是上述 1、2 两点要统筹考虑，针对工程量有错误的早期工程，如果不可能完成工程量表中的数量，则不能盲目抬高报价，要具体分析后再确定。B 错误。

3. 设计图纸不明确，估计修改后工程量要增加的，可以提高单价，而对工程内容说明不清的，则可降低一些单价。D 错误 E 正确。

【课后回顾总结】

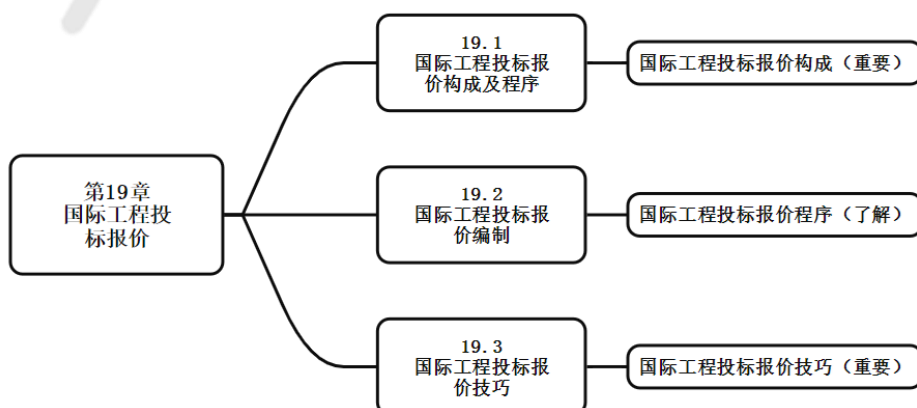

扫码关注更多内容

